

Introduction

Un projet IAM est une transformation majeure pour une organisation. Il ne s'agit pas seulement d'installer un logiciel, mais de repenser la façon dont les identités et les accès sont gérés. Ce chapitre présente les étapes clés et les facteurs de succès pour mener à bien un projet IAM.


Cycle de vie d'un projet IAM

Audit → Conception → Pilote → Déploiement → Gouvernance

1 Étapes d'un projet IAM

1.1 Audit initial

Objectif : Comprendre l'existant, identifier les problèmes et définir le périmètre du projet.



1.1.1 Cartographie de l'existant

À inventorier :

Élément	Questions à se poser
Utilisateurs	Combien ? Quels types (internes, externes, prestataires) ?
Applications	Combien ? Lesquelles sont critiques ? Compatibles SSO ?
Annuaire existant	Active Directory ? LDAP ? Autre ?
Processus actuels	Comment crée-t-on les comptes ? Comment les désactive-t-on ?
Droits existants	Qui a accès à quoi ? Y a-t-il des comptes partagés ?

Exemple de cartographie :

Entreprise TechDZ (50 employés)

- 8 applications critiques
- 3 comptes génériques sur Jira
- Anciens employés encore actifs dans le CRM
- Pas de MFA sur le VPN

1.1.2 Analyse des risques

Identifier les priorités :

Risque	Probabilité	Impact	Priorité
Comptes orphelins	Élevée	Élevé	Critique
Absence MFA	Élevée	Critique	Critique
Comptes partagés	Moyenne	Élevé	Élevé
Droits excessifs	Élevée	Moyen	Élevé

1.1.3 Définition des objectifs

Objectifs SMART :

- Spécifiques
- Mesurables
- Atteignables
- Réalistes
- Temporellement définis

Objectif	Critère de succès
Mettre en place le SSO	100% des applications compatibles intégrées d'ici 3 mois
Activer la MFA	100% des utilisateurs distants utilisent la MFA dans 2 mois
Automatiser provisionnement	Création de compte < 1h, suppression immédiate

1.2 Conception

Objectif : Définir l'architecture cible, choisir la solution et planifier le déploiement.

1.2.1 Choix de la solution

Comparaison des options :


Critère	On-premise	Cloud	Hybride
Coût initial	Élevé (matériel)	Faible (abonnement)	Moyen
Maintenance	Interne	Fournisseur	Mixte
Délai déploiement	Long	Rapide	Moyen
Contrôle données	Total	Partagé	Mixte
Exemples	Keycloak, OpenL-DAP	Azure AD, Okta	AD Connect

1.2.2 Définition des rôles (RBAC)


Modèle de groupes à créer :

Groupe	Membres	Accès
GRP_Tous	Tous les employés	Applications de base
GRP_Direction	3 personnes	Reporting, RH
GRP_Commercial	12 personnes	CRM, devis
GRP_Technique	25 personnes	Jira, dev
GRP_RH	5 personnes	Paie, dossiers RH
GRP_VPN	Tous + MFA	Accès distant

1.2.3 Architecture cible

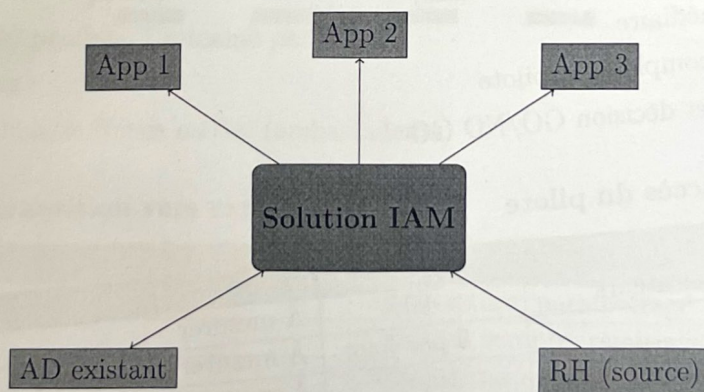

1.2.4 Planning prévisionnel



1.3 Déploiement pilote

Objectif : Tester la solution sur un périmètre réduit avant déploiement général.

1.3.1 Choix du périmètre pilote

Critères de sélection :

- Service volontaire et motivé
- Représentatif des cas d'usage
- Taille suffisante (10-30 utilisateurs)
- Applications critiques mais pas vitales

Service	Avantages	Inconvénients
Technique	Compétent, tolérant aux bugs	Pas représentatif des métiers
Commercial	Représentatif, mobilité	Critique pour l'activité
RH	Petit effectif, données sensibles	Risque élevé
Direction	Légitimité, soutien	Disponibilité limitée

Recommandation : Commencer par le service Technique (25 personnes) pour un premier pilote.

1.3.2 Déroulement du pilote

1. **J-7** : Communication et formation du pilote
2. **J1** : Migration des premiers utilisateurs
3. **J1-7** : Support renforcé (hotline dédiée)
4. **J7** : Bilan intermédiaire
5. **J14** : Migration complète du pilote
6. **J21** : Bilan final et décision GO/NO GO

1.3.3 Critères de succès du pilote

Critère	Cible	Résultat
Taux de satisfaction utilisateurs	> 80%	À mesurer
Tickets support	< 5 par jour	À mesurer
Taux d'adoption MFA	100%	À mesurer
Temps de connexion	< 30 secondes	À mesurer

Point d'attention :

Le pilote doit révéler les problèmes avant le déploiement général. Il vaut mieux les découvrir sur 25 personnes que sur 500 !


1.4 Généralisation

Objectif : Déployer la solution à l'ensemble de l'organisation.

1.4.1 Stratégie de déploiement

Stratégie	Description	Avantages/Inconvénients
Big Bang	Tout le monde en même temps	Rapide mais risqué
Par vagues	Groupe successifs	Maîtrisé mais plus long
Par application	Une application après l'autre	Progressif mais complexe

Recommandation : Déploiement par vagues (par service) :



1.4.2 Plan de communication

Moment	Action	Cible
J-15	Annonce du projet	Tous
J-7	Email explicatif + FAQ	Vague concernée
J-2	Guide pas-à-pas	Vague concernée
Jour J	Support dédié	Vague concernée
J+7	Bilan intermédiaire	Tous

1.4.3 Support post-déploiement

Organisation du support :

- Hotline dédiée pendant 1 semaine par vague
- FAQ évolutive
- Astreinte technique Relais métier (ambassadeurs)

1.4.4 Bilan et transition vers exploitation

Livrable	Description
Documentation technique	Architecture, paramétrage
Procédures	Création compte, réinitialisation
Formation équipe IT	Administration courante
Rapport de projet	Bilan, KPI, leçons apprises
Planning revues	Révisions périodiques des accès

2 Facteurs clés de succès

2.1 Engagement direction

Pourquoi c'est crucial ?

- Un projet IAM impacte toute l'organisation
- Nécessite des ressources (budget, temps)
- Implique des changements d'habitudes
- La direction donne l'exemple

2.1.1 Comment obtenir et maintenir cet engagement ?

Action	Bénéfice
Présenter le ROI	Montrer le retour sur investissement
Illustrer les risques	Exemples de fuites de données
Montrer la conformité	Éviter les amendes RGPD
Impliquer la direction	Sponsor visible du projet
Reporting régulier	Tenir informé, montrer les progrès

Bonne pratique :


Désigner un "sponsor" au COMEX qui porte le projet et arbitre les décisions.

2.2 Conduite du changement

Pourquoi c'est crucial ?

- Les utilisateurs résistent naturellement au changement
- Un projet IAM change leurs habitudes quotidiennes
- Le rejet utilisateur peut faire échouer le projet

2.2.1 Les 3 phases de la conduite du changement



1. **Décristallisation** : Faire comprendre pourquoi le changement est nécessaire
2. **Changement** : Accompagner pendant la transition
3. **Recristallisation** : Stabiliser les nouvelles pratiques

2.2.2 Outils de conduite du changement

Outil	Usage
Communication	Expliquer le pourquoi, le comment, le quand
Formation	Donner les compétences nécessaires
Support	Aider en cas de difficulté
Ambassadeurs	Relais métier qui entraînent leurs collègues
Quick wins	Montrer rapidement des bénéfices concrets

2.3 Formation utilisateurs

Pourquoi c'est crucial ?

- Des utilisateurs formés = moins d'erreurs
- Moins de tickets support
- Meilleure adoption des bonnes pratiques (MFA, mots de passe robustes)
- Satisfaction et productivité

2.3.1 Plan de formation

Public	Contenu	Format
Utilisateurs standards	Connexion SSO, MFA, bonnes pratiques	e-learning 15 min
Managers	Gestion des accès de leur équipe + contenu standard	Atelier 1h
RH	Processus provisionnement, lien avec l'outil RH	Atelier 2h
Équipe IT	Administration, maintenance, troubleshooting	Formation technique 2 jours

2.3.2 Supports de formation

- Guide utilisateur (PDF 2 pages)
- Vidéo tutorielle (5 minutes)
- FAQ évolutive
- Aide contextuelle dans les applications
- Sessions de questions-réponses en visio

Erreur à éviter :

"On enverra un mail, ça suffira" → NON ! Un mail ne forme pas.
Les utilisateurs liront-ils ? Comprendront-ils ? Appliqueront-ils ?
